


CRONOGRAMA CONTRUCCION CASA ECONOMICA
SRA. NOEMI VALDEZ



Proyecto: NOEMI VALDEZ

Tarea

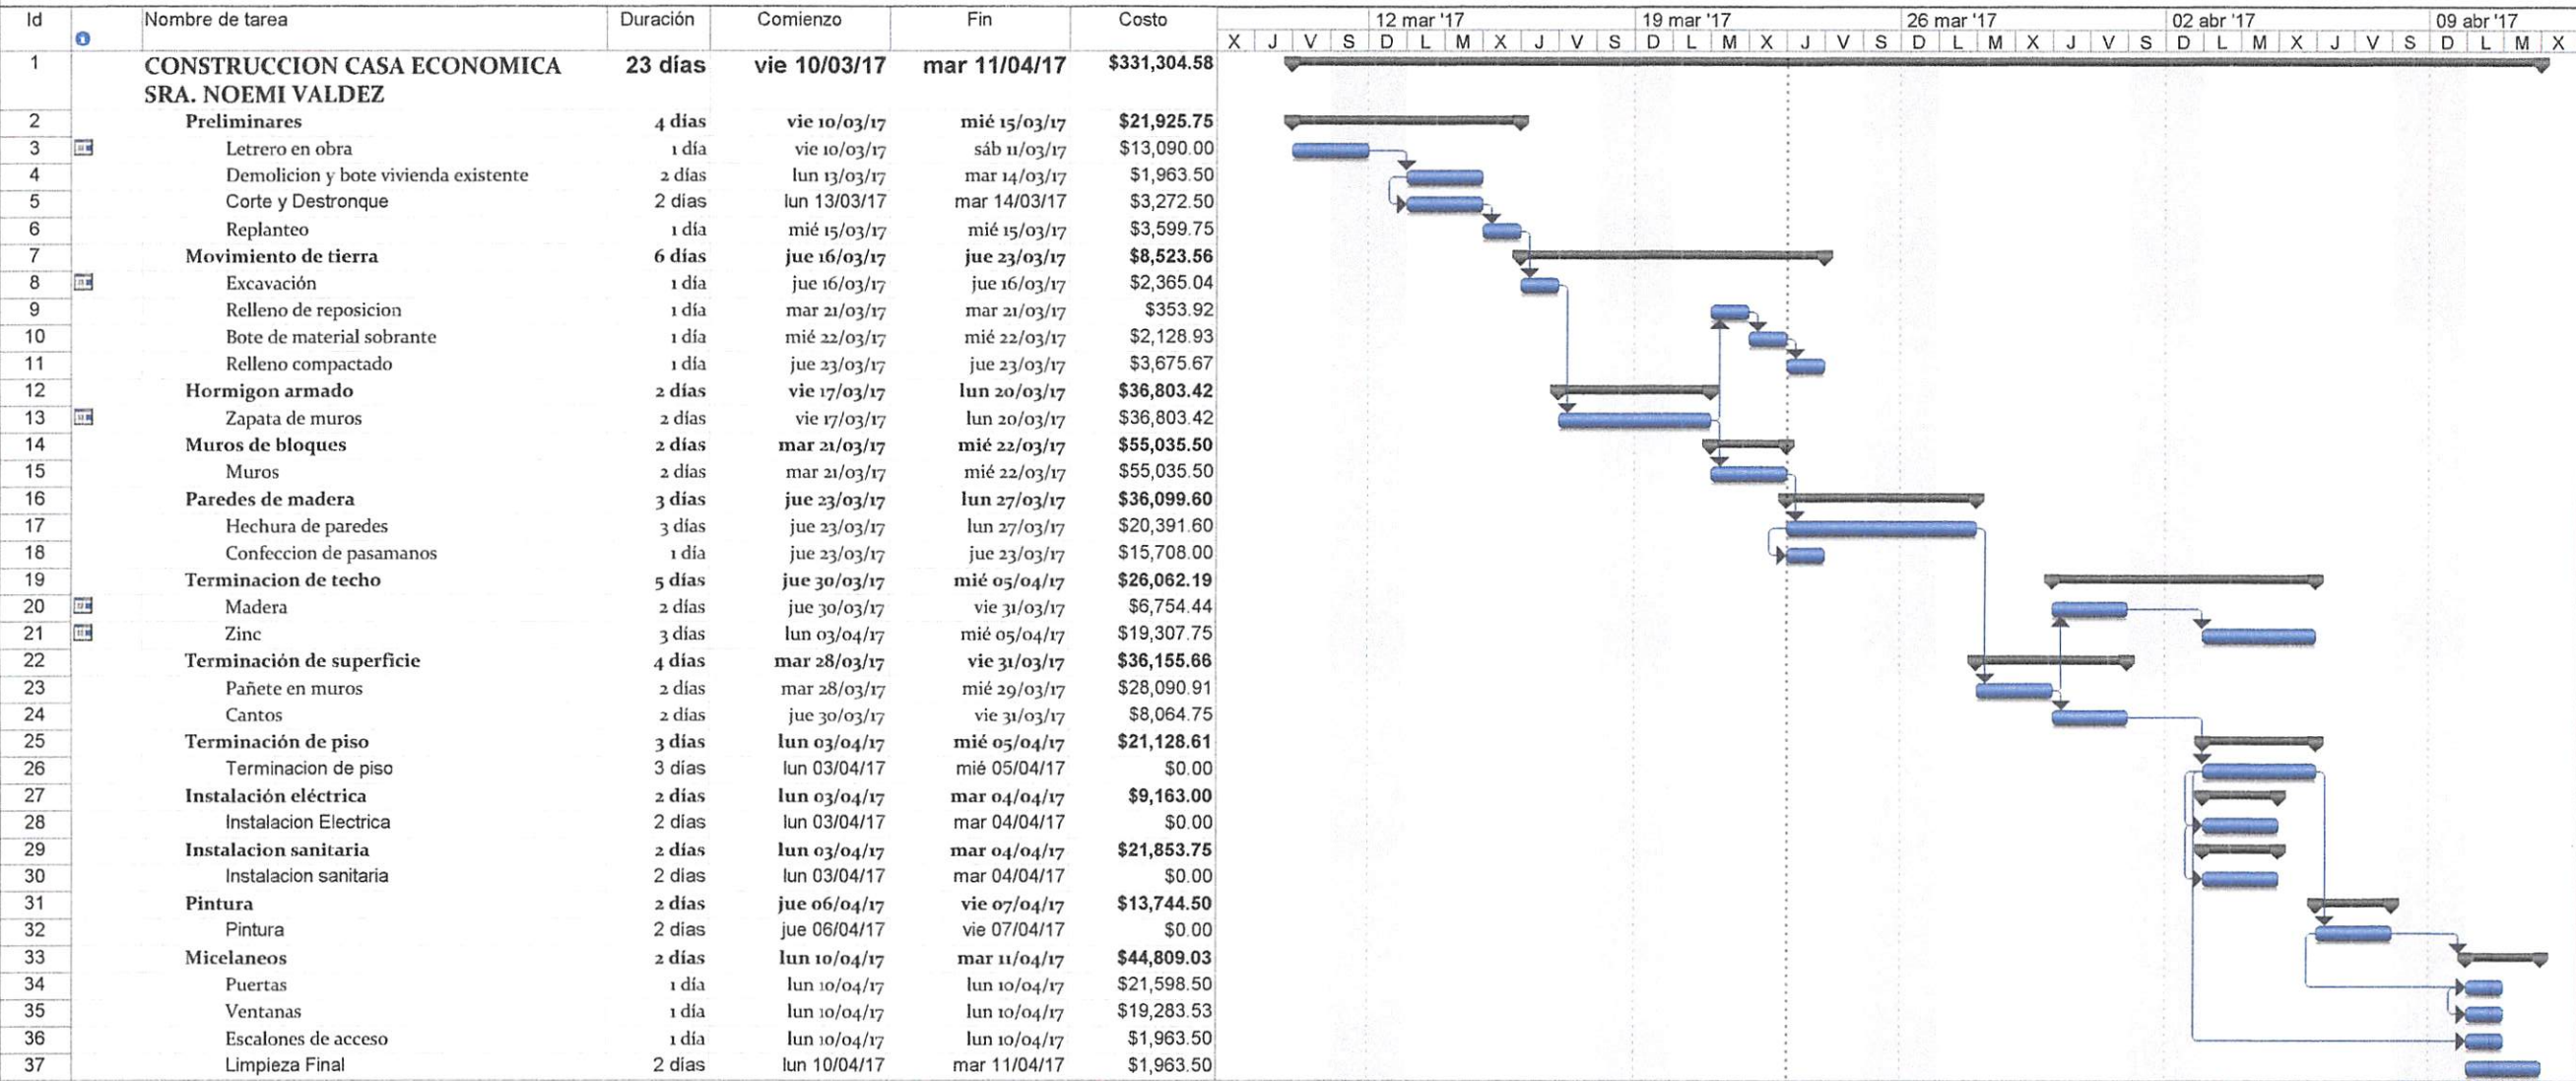

Progreso



Resumen



Tareas externas



Fecha límite



División



Hito



Resumen del proyecto



Hito externo



ING. YANERYS VARGAS TEJADA


CRONOGRAMA CONSTRUCCION CASA ECONOMICA												
SRA. NICOLAZA MARTINEZ												
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart Timeline						
1	CONSTRUCCION CASA ECONOMICA SRA. NICOLAZA MARTINEZ	29 días	vie 10/03/17	mié 19/04/17	\$322,802.76							
2	Preliminares	2 días	vie 10/03/17	lun 13/03/17	\$18,653.25							
3	Letrero en obra	1 día	vie 10/03/17	vie 10/03/17	\$13,090.00							
4	Demolicion y bote vivienda existente	1 día	vie 10/03/17	vie 10/03/17	\$1,963.50							
5	Replanteo	1 día	lun 13/03/17	lun 13/03/17	\$3,599.75							
6	Movimiento de tierra	8 días	vie 10/03/17	mar 21/03/17	\$8,332.79							
7	Excavación	2 días	vie 10/03/17	lun 13/03/17	\$2,267.84							
8	Relleno de reposicion	2 días	jue 16/03/17	vie 17/03/17	\$269.16							
9	Bote de material sobrante	1 día	lun 20/03/17	lun 20/03/17	\$2,304.68							
10	Relleno compactado	2 días	lun 20/03/17	mar 21/03/17	\$3,491.10							
11	Hormigon armado	2 días	mar 14/03/17	mié 15/03/17	\$35,360.15							
12	Zapata de muros	2 días	mar 14/03/17	mié 15/03/17	\$35,360.15							
13	Muros de bloques	2 días	jue 16/03/17	vie 17/03/17	\$51,440.21							
14	Muros	2 días	jue 16/03/17	vie 17/03/17	\$51,440.21							
15	Paredes de madera	3 días	lun 20/03/17	mié 22/03/17	\$36,099.60							
16	Hechura de paredes	3 días	lun 20/03/17	mié 22/03/17	\$20,391.60							
17	Confeccion de pasamanos	1 día	lun 20/03/17	lun 20/03/17	\$15,708.00							
18	Terminacion de techo	6 días	jue 23/03/17	jue 30/03/17	\$26,062.19							
19	Madera	2 días	jue 23/03/17	vie 24/03/17	\$6,754.44							
20	Zinc	4 días	lun 27/03/17	jue 30/03/17	\$19,307.75							
21	Terminación de superficie	6 días	vie 31/03/17	vie 07/04/17	\$36,155.66							
22	Pañete en muros	3 días	vie 31/03/17	mar 04/04/17	\$28,090.91							
23	Cantos	3 días	mié 05/04/17	vie 07/04/17	\$8,064.75							
24	Terminación de piso	3 días	lun 10/04/17	mié 12/04/17	\$21,128.61							
25	Terminacion de piso	3 días	lun 10/04/17	mié 12/04/17	\$0.00							
26	Instalación eléctrica	2 días	lun 10/04/17	mar 11/04/17	\$9,163.00							
27	Instalacion electrica	2 días	lun 10/04/17	mar 11/04/17	\$0.00							
28	Instalacion sanitaria	2 días	lun 10/04/17	mar 11/04/17	\$21,853.75							
29	Instalacion Sanitaria	2 días	lun 10/04/17	mar 11/04/17	\$0.00							
30	Pintura	3 días	jue 13/04/17	lun 17/04/17	\$13,744.50							
31	Pintura	3 días	jue 13/04/17	lun 17/04/17	\$0.00							
32	Miscelaneos	8 días	lun 10/04/17	mié 19/04/17	\$44,809.03							
33	Puertas	1 día	jue 13/04/17	jue 13/04/17	\$21,598.50							
34	Ventanas	1 día	jue 13/04/17	jue 13/04/17	\$19,283.53							
35	Escalones de acceso	1 día	lun 10/04/17	lun 10/04/17	\$1,963.50							
36	Limpieza final	2 días	mar 18/04/17	mié 19/04/17	\$1,963.50							

Proyecto: NICOLAZA MARTINEZ Tarea: [Bar] Progreso: [Line] Resumen: [Icon] Tareas externas: [Bar] Fecha límite: [Icon]

División: [Dotted Line] Hito: [Diamond] Resumen del proyecto: [Wide Bar] Hito externo: [Diamond]

ING. YANERYS VARGAS TEJADA
Página 1

CRONMOGRA CONSTRUCCION CASA ECONOMICA SRA. CONFESORA RAMIREZ

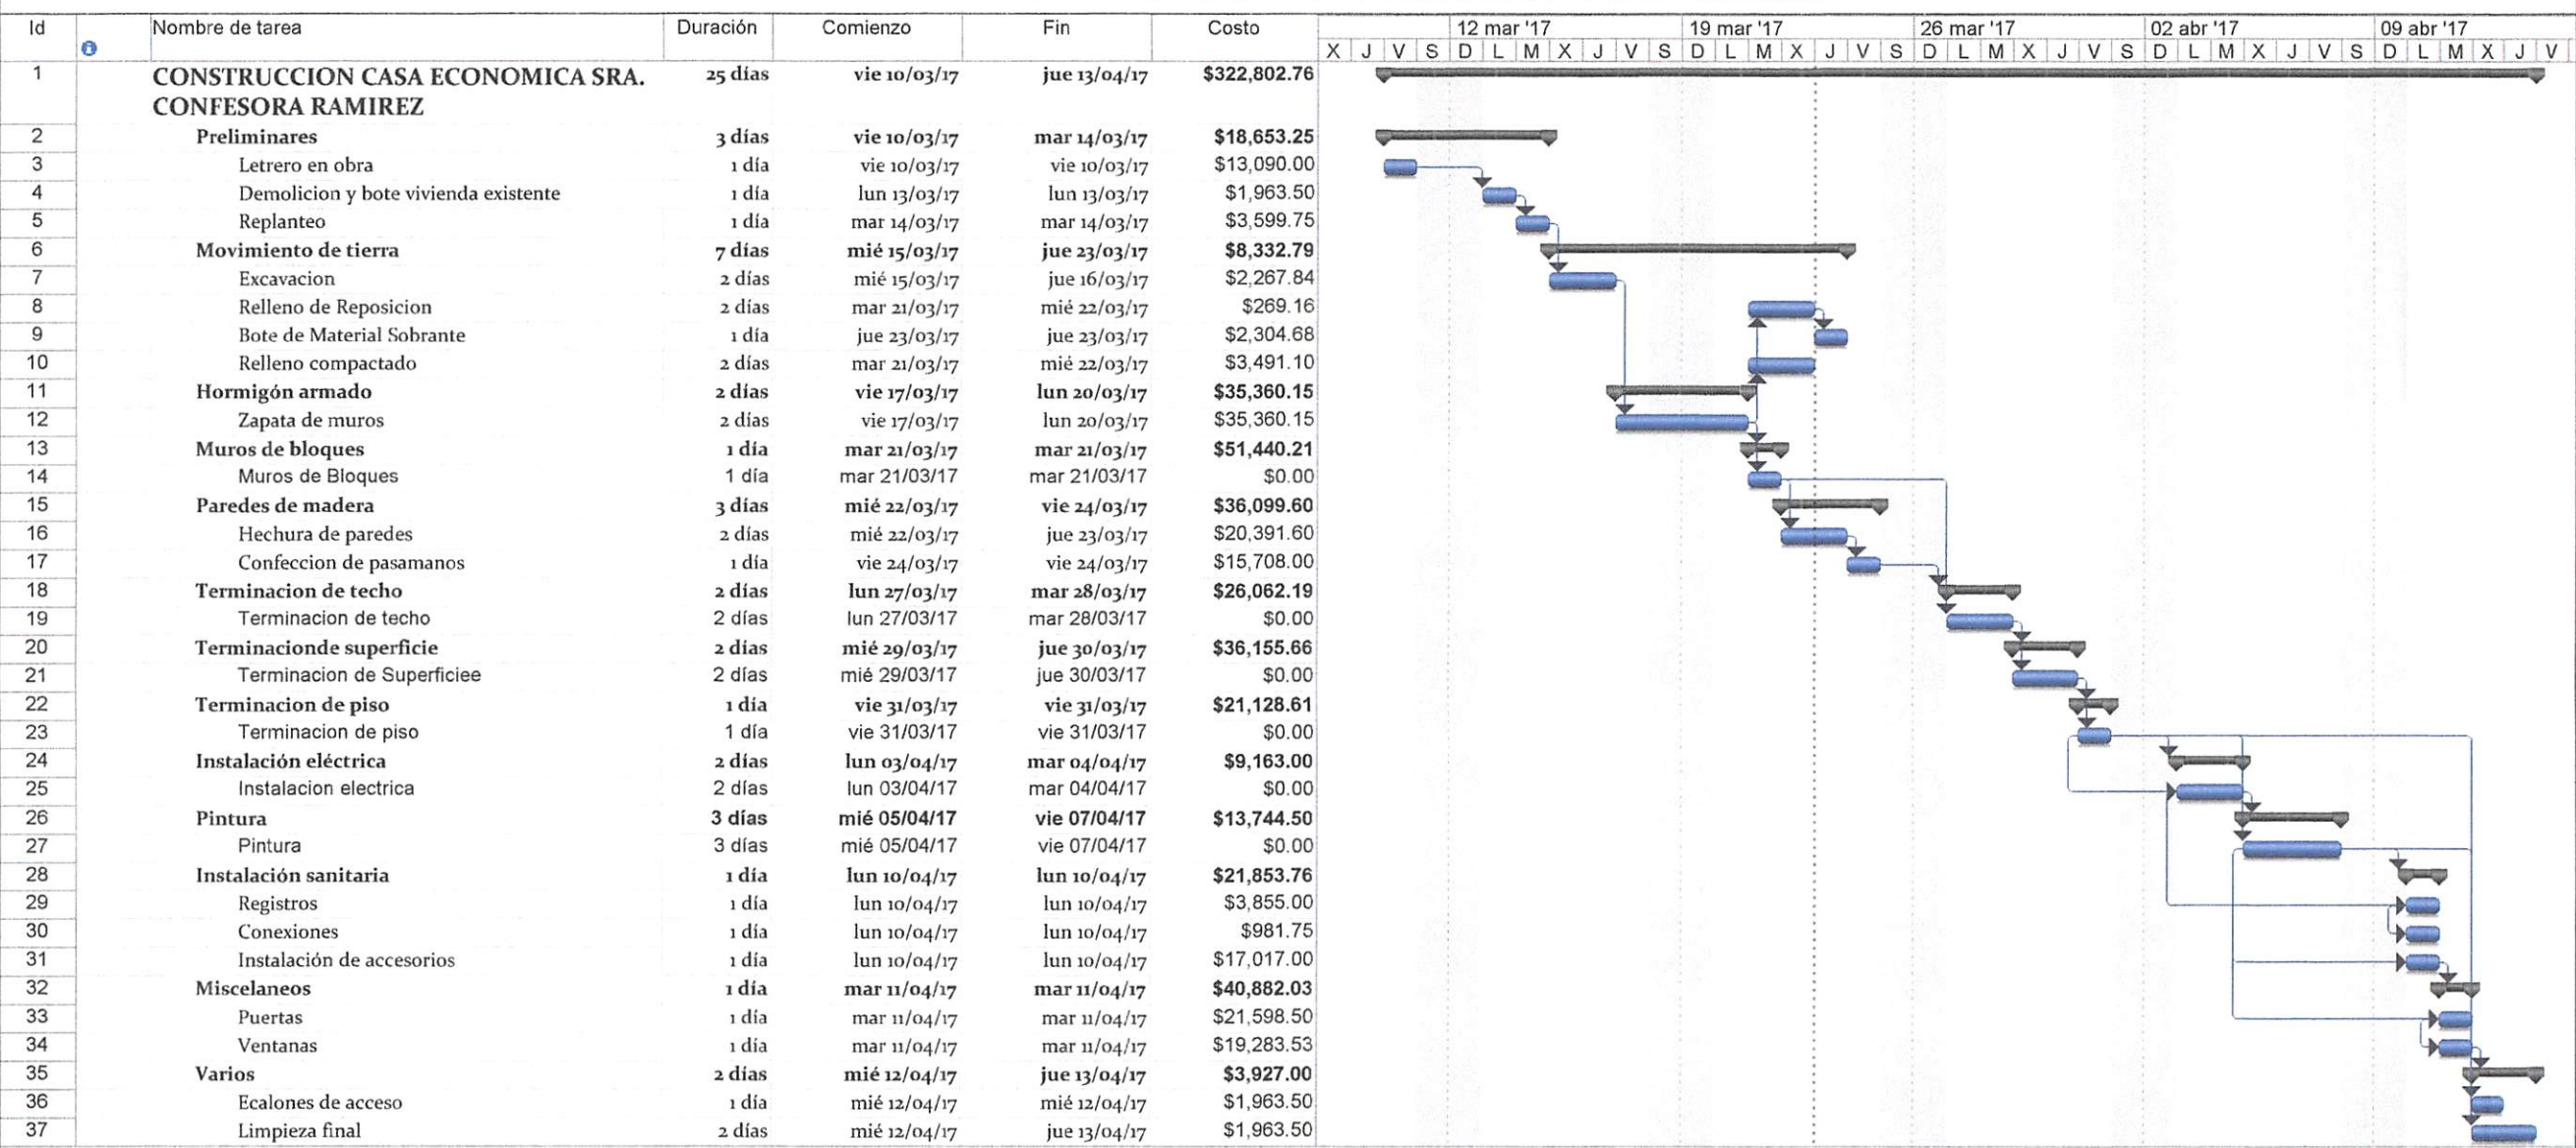

Proyecto:CONFESORA RAMIREZ

Tarea



Progreso



Resumen



Tareas externas



Fecha límite



División



Hito



Resumen del proyecto



Hito externo



ING. YANERYS VARGAS TEJADA

Página 1
